


NEHRINGA 15,17

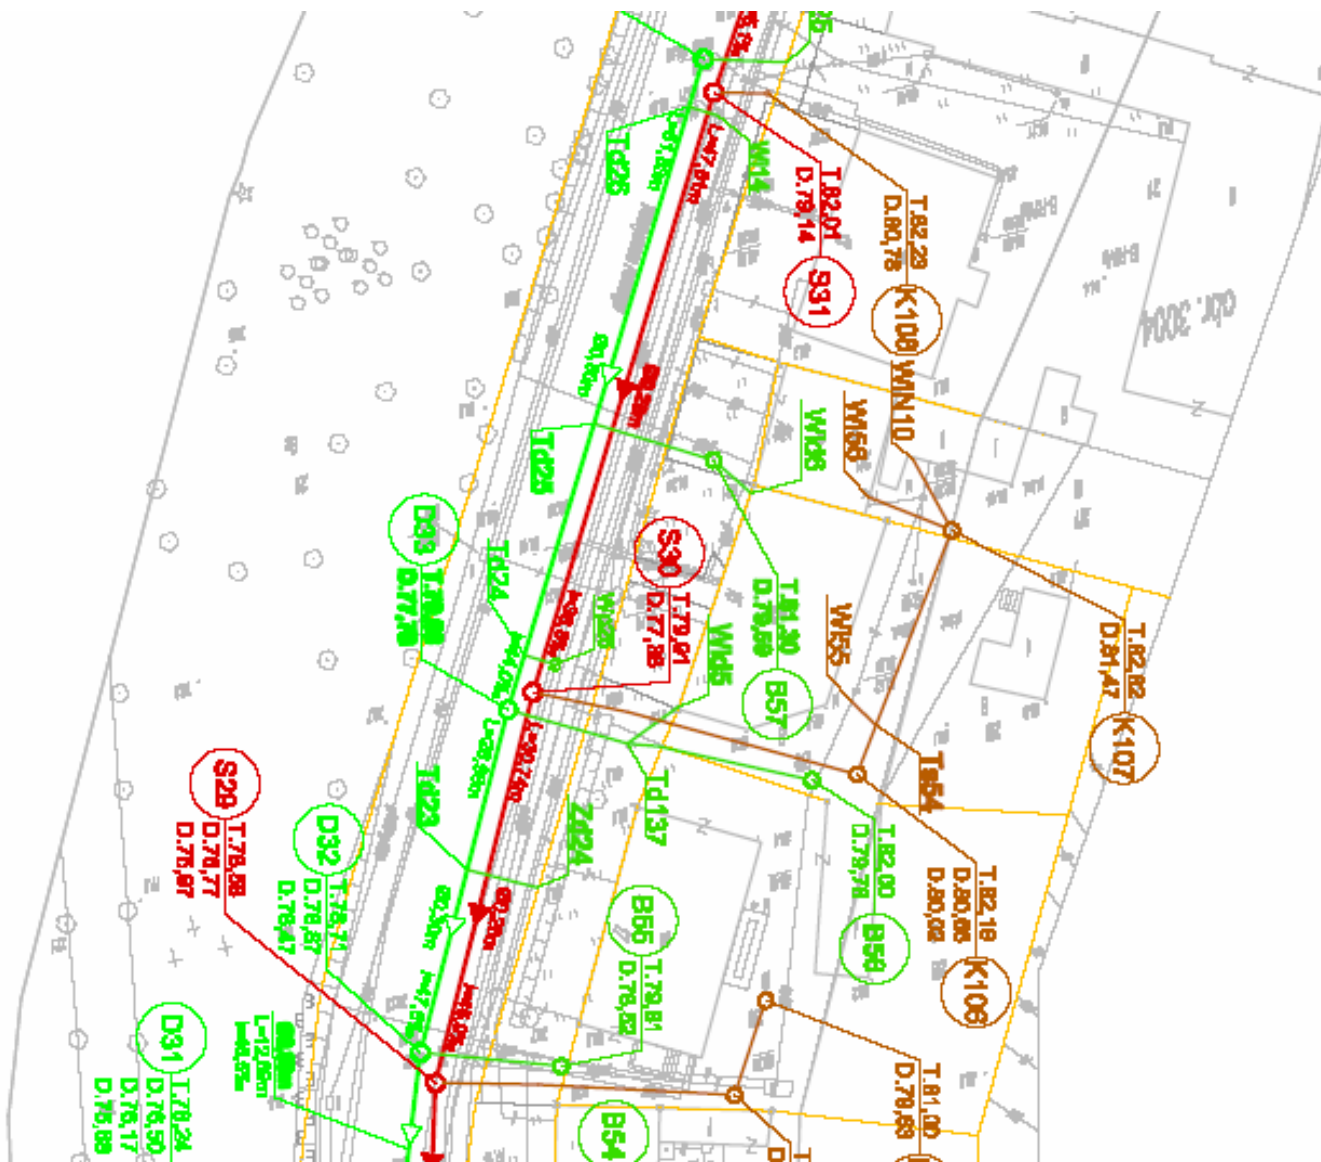

BUDYNEK NR 15

I INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna :

- a) a) Wł 56 i WłN10 do studni K107
- b) b) Wł 55 do Ts 54

Stara instalacja zewnętrzna na narożniku budynku do likwidacji z powodu niemożności wykonania podłączenia w tym miejscu. Należy przeprojektować wewnętrzną instalację w celu podłączeniem do wykonanej nowej instalacji zewnętrznej.

2. Kanalizacja deszczowa:

- wykonane podłączenie do budynku w dwóch punktach

- a) Włd 5
- b) Włd 6
- c) Włd 7

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- 1. Brak WC dla mieszkań nr: 2, 3, 6, 8, 10, 11 .
- 2. Do zalegalizowania istniejące WC i/lub łazienek:
 - a) w mieszkaniach nr: 5 , 7
- 3. Legalne wc w lokalach nr 1 i 4

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

- 1. Szambo przy toaletach 1 szt. do likwidacji i 6 szt. toalet murowanych do rozbiórki.

BUDYNEK NR 17 umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

- 1. Kanalizacja sanitarna
 - nie zaprojektowana i nie wykonana instalacja zewnętrzna
 - studnia K 105 – brak odejścia w kierunku budynku
 - studnia K104 – brak odejścia w kierunku budynku
- 2. Kanalizacja deszczowa
 - nie zaprojektowana i nie wykonana instalacja zewnętrzna
 - studnia deszczowa B 55 – brak odejścia w kierunku budynku

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Lokale M1, M2 i M3 posiadają wc legalne

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

- 1. Szambo 1 szt nie używane w podwórzu do likwidacji

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M 3, 4 - łazienka z w.c. – zalegalizowana
2. Dla mieszkań nr : 1,2, 5,7 należy zalegalizować istniejące wc

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

1. Szambo 1 szt od toalet do likwidacji
2. Nieczynne murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

BUDYNEK 23 – budynek wytypowany do remontu kapitalnego

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

- miejsce
1. Kanalizacja sanitarna – włączona do budynku
- jest projekt i wykonane podłączenie do budynku w jednym
a) Wł 53 – od studni K 102
 2. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona do budynku
- brak projektu instalacji zewnętrznej i brak odejścia w kierunku budynku
a) B 53

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA- wykonana ekspertyza dotycząca remontu kapitalnego budynku

1. Dla mieszkań: M 1, M 2, M3, M4, M7, M 8 należy zapewnić WC

III. LEGALIZACJA / ROZBIÓRKA

1. Szambo- 1 szt do likwidacji
2. Toalety w podwórzu murowane – do rozbiórki

BUDYNEK 25 – budynek typowany do remontu kapitalnego

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – nie podłączona, są zawarte umowy ze ZwiK, nie ma projektu i podłączenia do budynku

- a) studnia K 101
- b) studnia K 100
- c) studnia K 98
- d) studnia K 99

3. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona
- brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.


- a) studnia B51
- b) studnia B52

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA - wykonana ekspertyza dotycząca remontu kapitalnego budynku

- 1. Dla mieszkań: M 2, M 4, M5, M6 należy zapewnić wc

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

- 1. Szambo od toalet do likwidacji
- 2. Murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

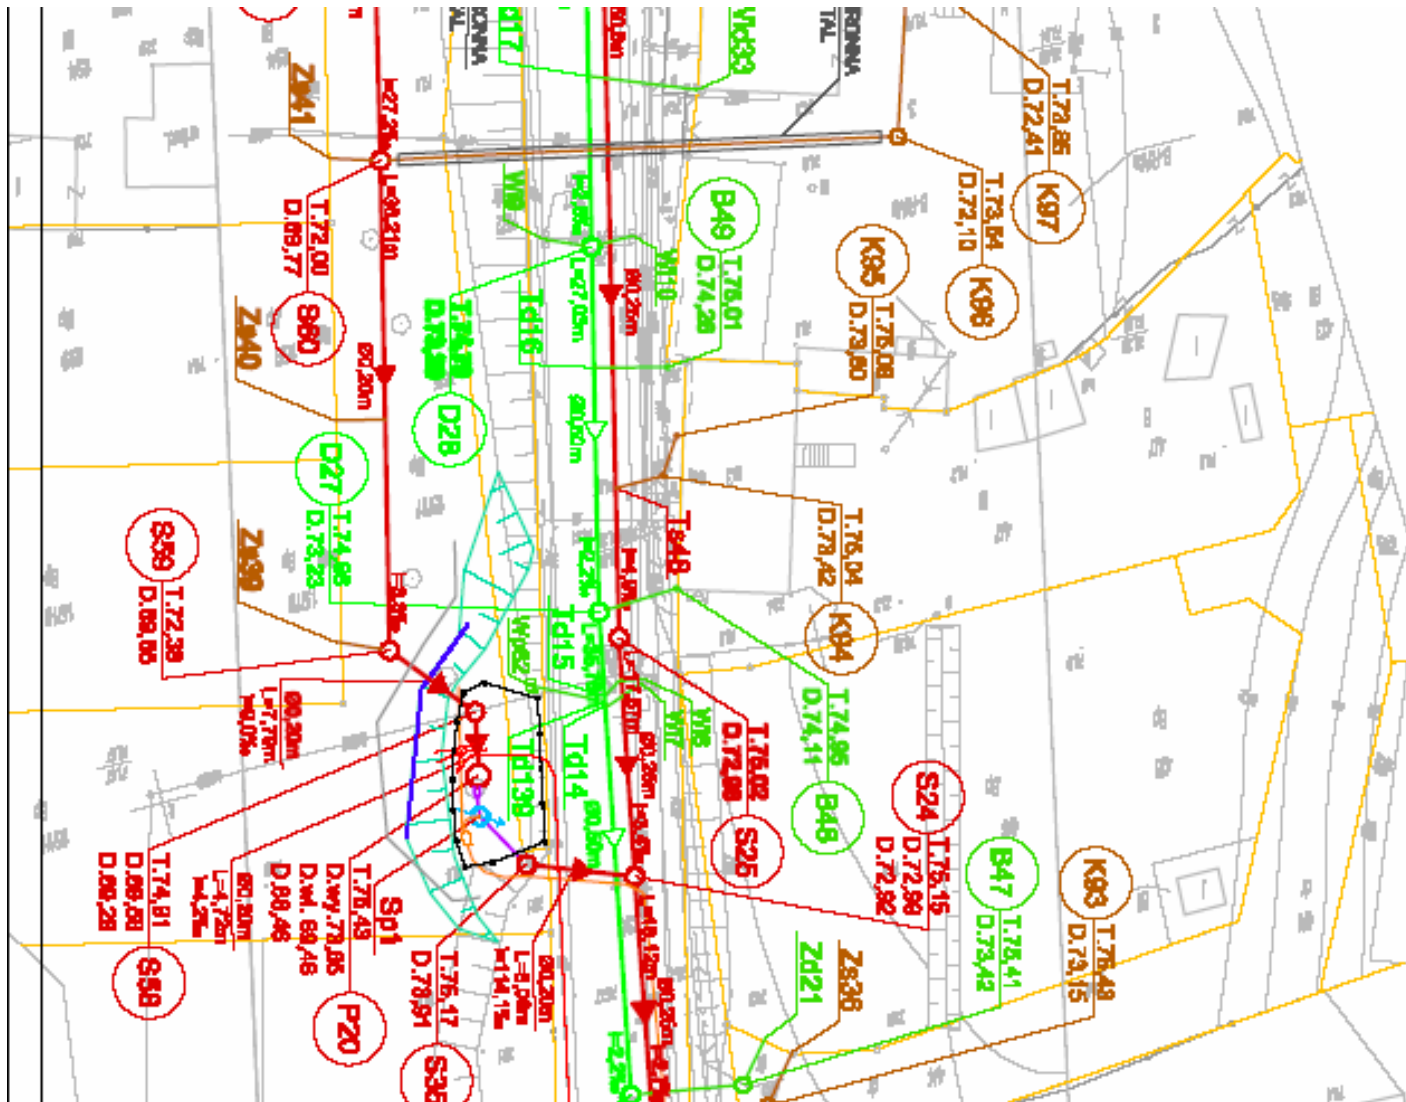

BUDYNEK 29- wykonana ekspertyza budynek do remontu kapitalnego

I. NSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – nie podłączona, są zawarte umowy z ZWiK
2. Nie ma projektu i podłączenia do budynku
 - c) studnia K 95
 - d) studnia K 94
3. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona
 - brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.
 - a) studnia B49
 - b) studnia B48

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona,
 - a) Wł 45- do studni K 83
2. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona
- brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.
 - a) studnia B 44

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- a) M 3 - WC zalegalizowane.
- b) M 1, M2 – WC na klatce schodowej legalne

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

Brak.

BUDYNEK 37

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt i podłączenie do budynku
 - a) Wł 43 – do studni K 84
 - b) Wł 44 – do studni K 86
2. Kanalizacja deszczowa- brak projektu
 - a) studnia B 42


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M6 - WC legalne
2. M1, M2,- WC brak, posiadają tylko łazienki legalne.

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

- a) Toalety w podwórzu murowane do rozbiórki
- b) Szambo przy toaletach do likwidacji

NEHRINGA 39

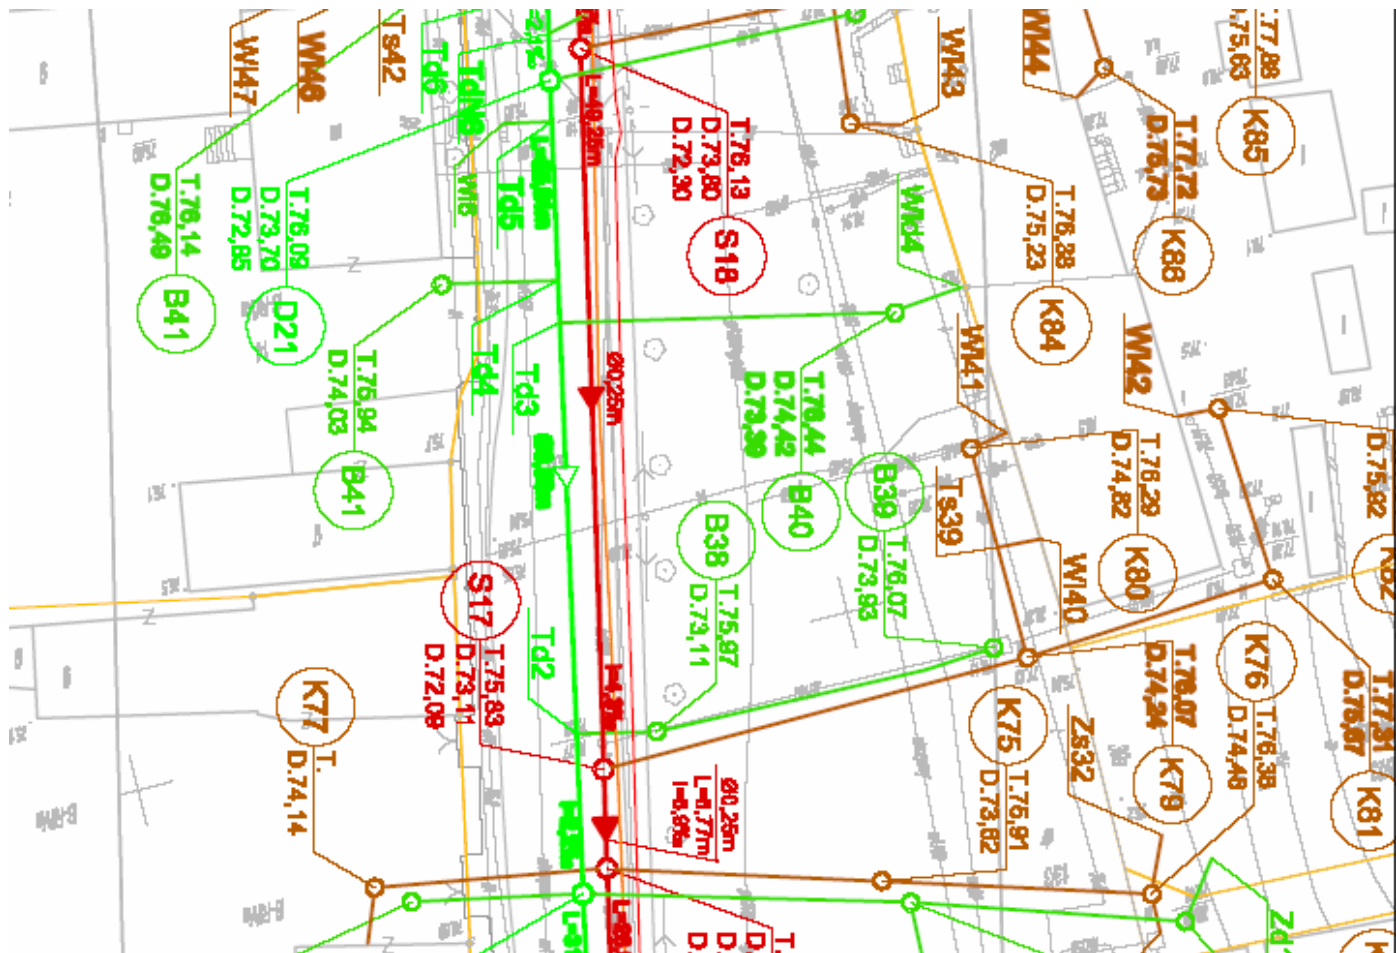

BUDYNEK 39

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona do budynku
 - a) Wł 42- do studni K 82
 - b) Wł 40 - do studni K 80 poprzez Ts 39
 - c) Wł 41 – studni K 80

2. Kanalizacja deszczowa –do zaprojektowania zewn. instalacja deszczowa od studni B 39
 - a) podłączona w miejscu Włd 4- do studni B 40.

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Zaprojektować WC dla: M 4, M 5, M6, M8, M10, M11
2. W mieszkaniach M1, M2,M3,M7– brak legalizacji.

III. LIKWIDACJA /ROZBIÓRKA

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – nie podłączona,
nie ma projektu i podłączenia do budynku
 - a) studnia K 41

2. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona,
brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.
 - a) studnia B58


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA - wykonana ekspertyza dotycząca rozbiórki budynku

1. Dla M 4, M 6 wydzielic WC

2. M1 – WC legalne.

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

1. Szambo w podwórzu i od toalet do likwidacji
2. Murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

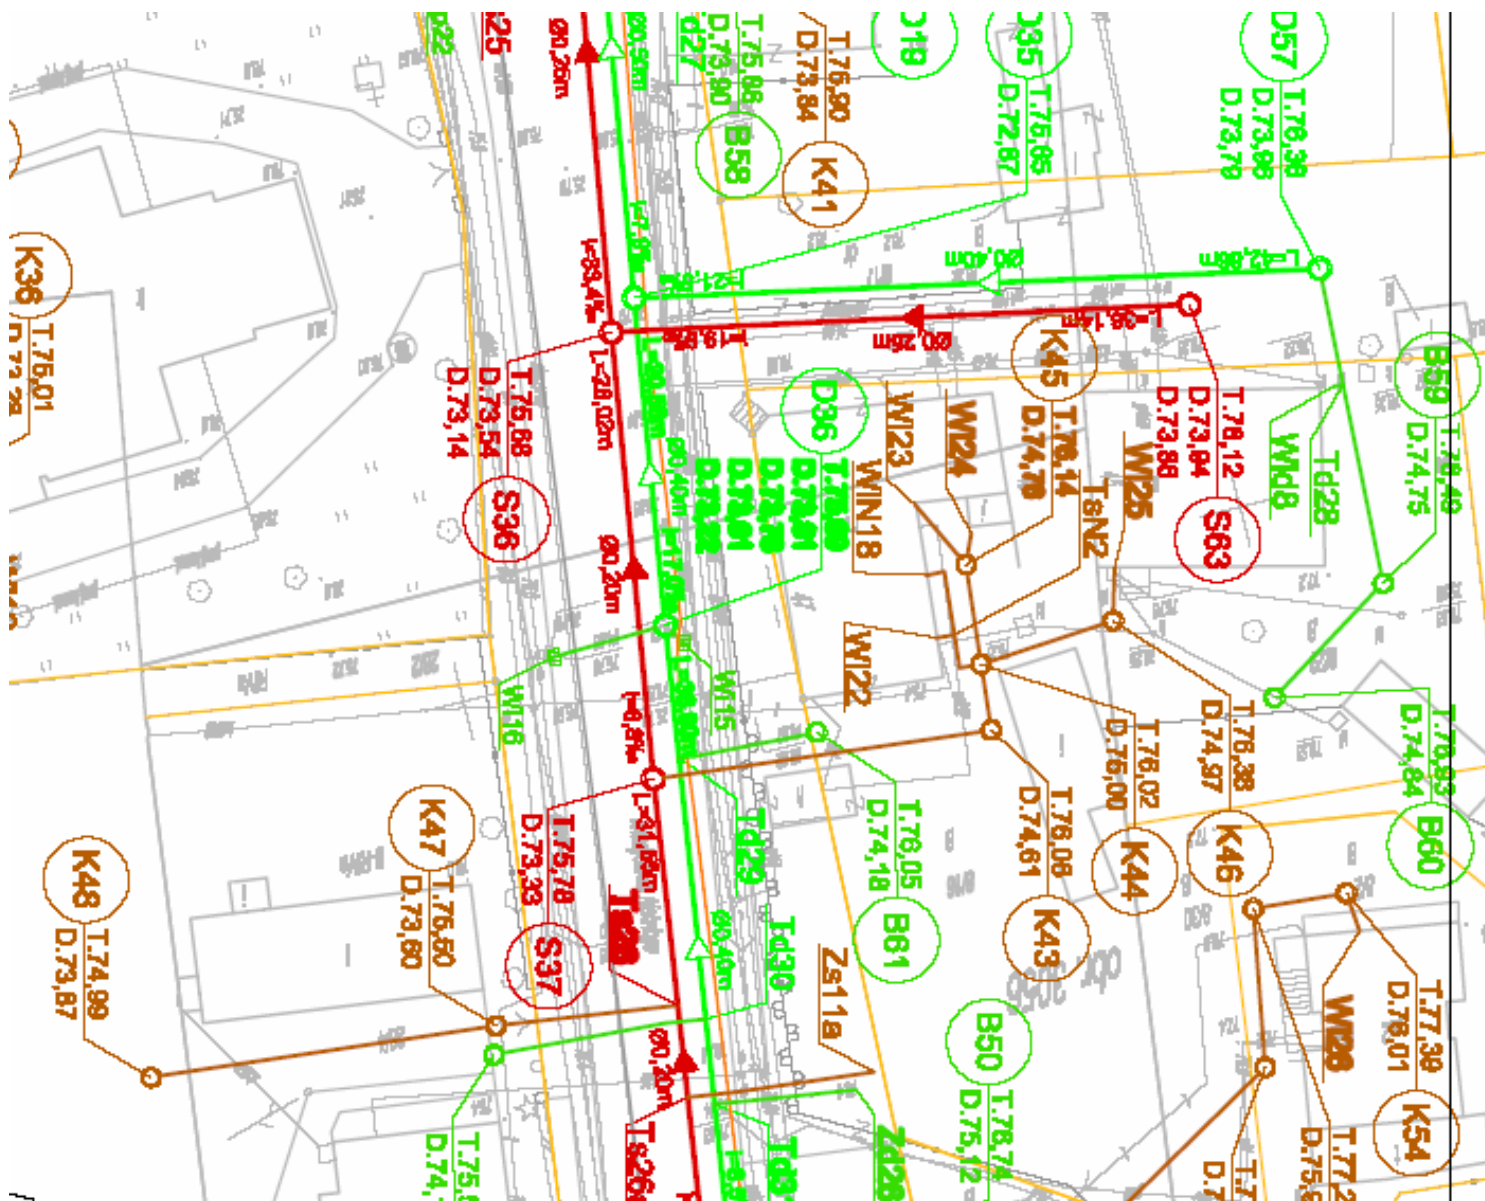

BUDYNEK 45- wykonana ekspertyza budynek do rozbiórki

I. NSTALLACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona do budynku zgodnie z projektem
 - a) Wł 25 do studni K 46
 - b) Wł 24 do studni K 45

2. Kanalizacja deszczowa – nie podłączona,
brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.
 - a) studnia D57
 - b) studnia B59
 - c) studnia B60

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA - wykonana ekspertyza dot. rozbiórki budynku

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

1. Szambo od toalet do likwidacji
2. Murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

BUDYNEK 47- wykonana ekspertyza budynek do rozbiórki

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona zgodnie z projektem
 - a) Wł 23 do studni K45
 - b) Wł 18, Wł 22 do studni K44
2. Kanalizacja deszczowa,
brak projektu i wykonania instalacji zewnętrznej.
 - a) studnia B61


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA - wykonana ekspertyza dot. rozbiórki budynku

1. M 3, – wc na klatce schodowej wykonane przez lokatora
2. WC/łazienka w mieszkaniach: M 2, M1, M1a – nie legalne

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

1. Szambo od toalet do likwidacji
2. Murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

NEHRINGA 65

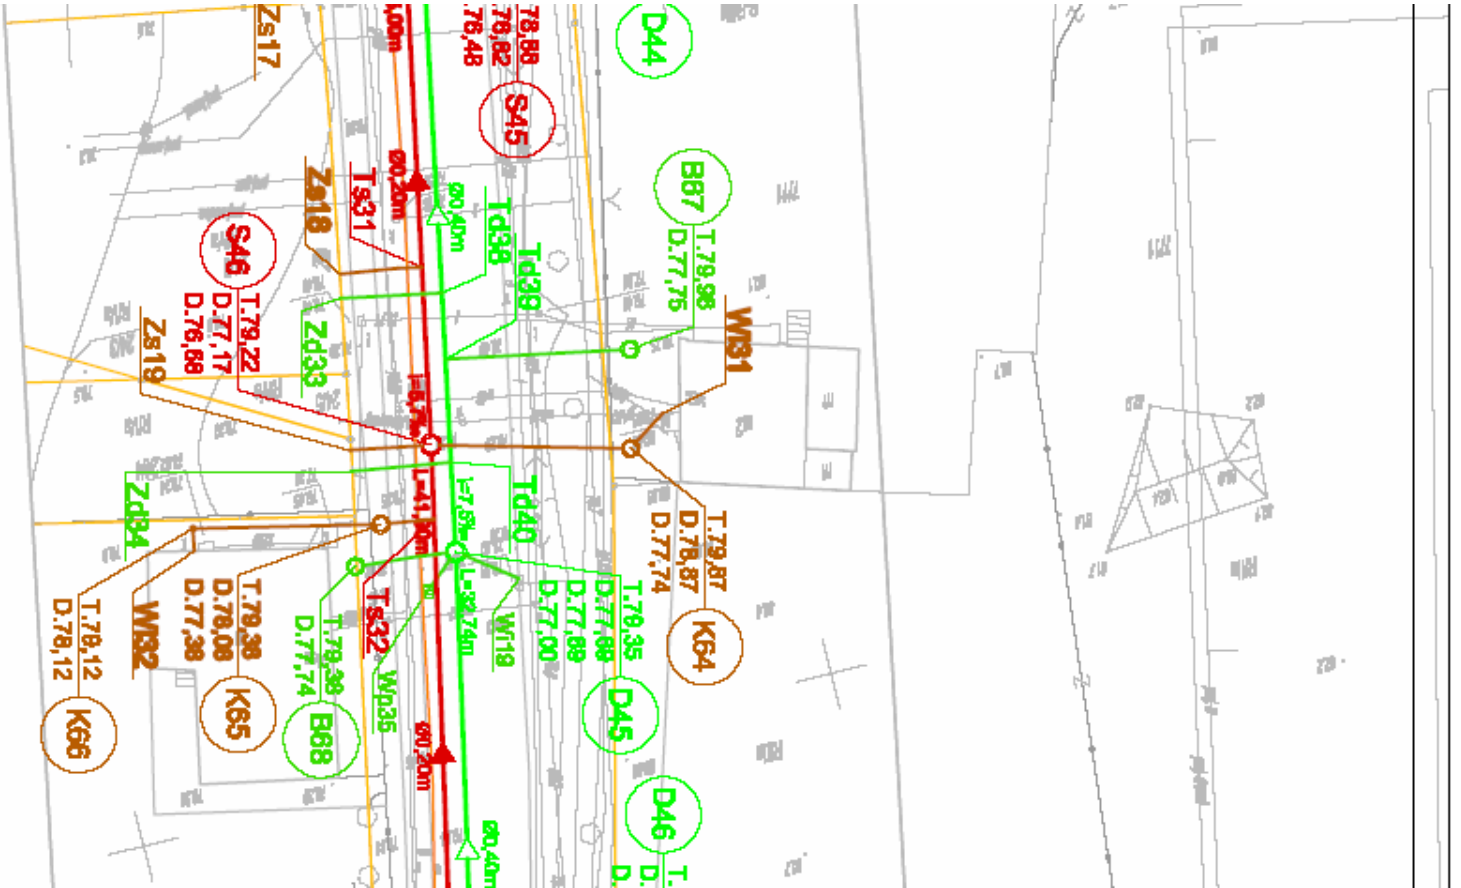

BUDYNEK 65

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona do budynku
a) Wł 31 poprzez szambo do studni K 64
2. Kanalizacja deszczowa –
Należy zaprojektować instalację zewnętrzną od budynku do studni B67


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. W mieszkaniach: M 1 i M 2 - WC nielegalne

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

Brak

NEHRINGA 67

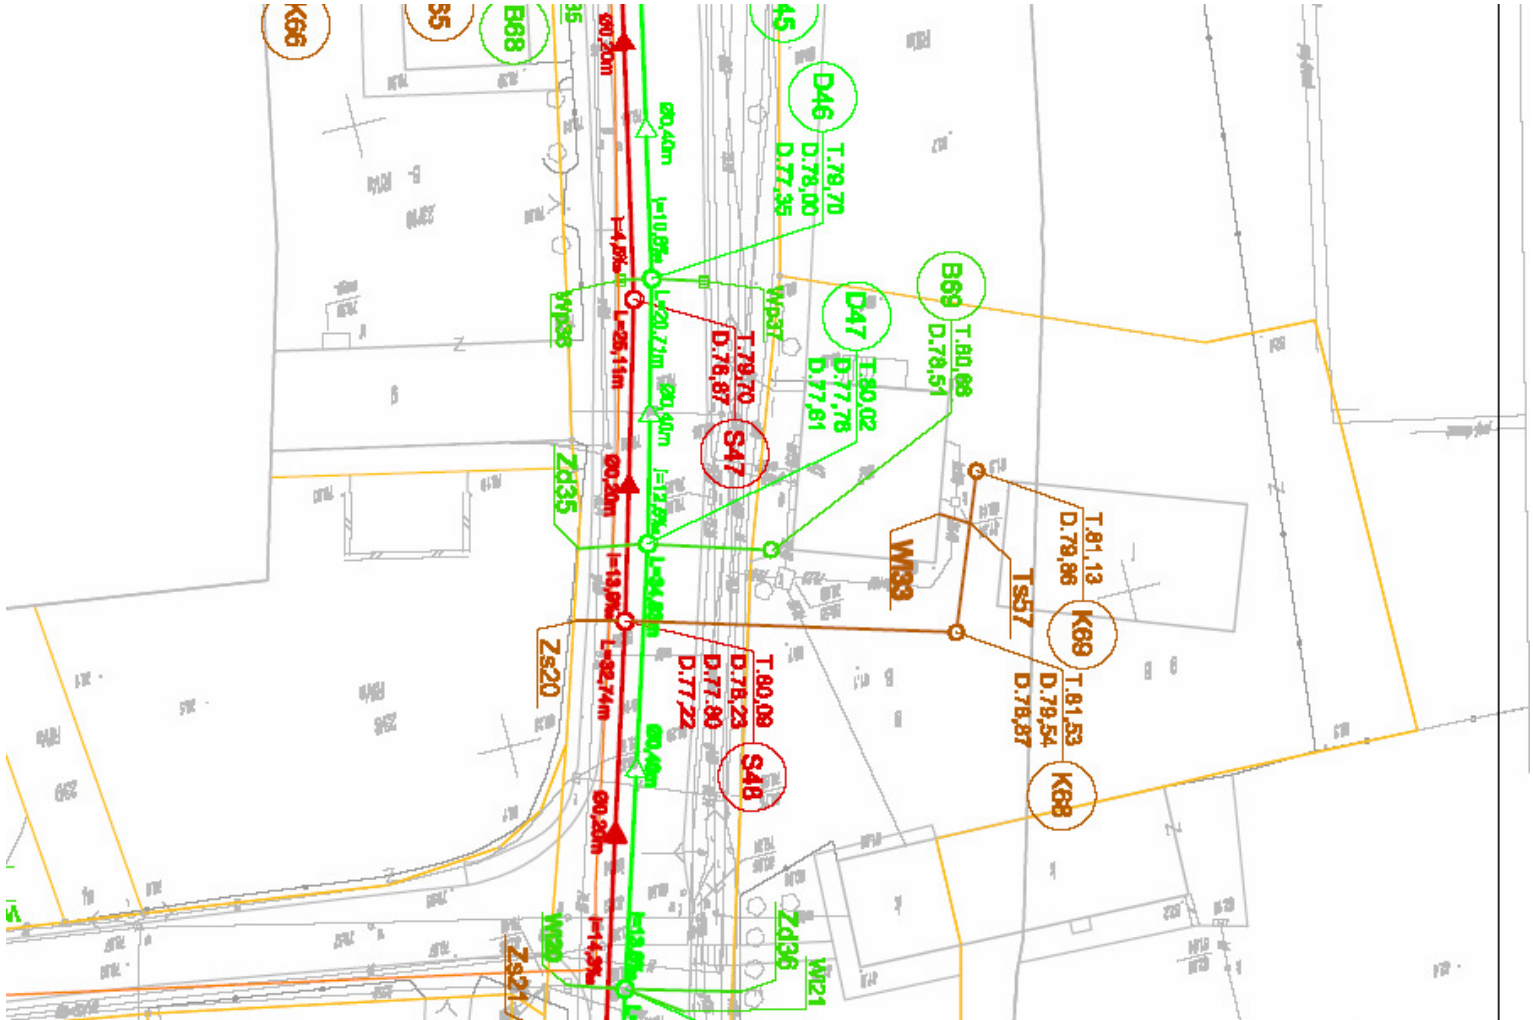

BUDYNEK 67

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – podłączona tylko w jednym punkcie do budynku
 - a) Wł 33 - do Ts 57
 - b) studnie K 69, K 68
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu
 - a) studnia B 69

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Zaprojektować WC dla: M 1, M 4,

instalacji deszczowej do istniejącej starej instalacji kanalizacji deszczowej w ulicy.


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. W mieszkaniach M1, M2, M3, M5 należy dokonać legalizacji łazienek z w.c.
2. W mieszkaniach M4, M6 należy zaprojektować wydzielenie pomieszczeń w.c.

IV. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

1. Szamba od toalet w podwórzu do likwidacji
2. Murowane toalety w podwórzu – do rozbiórki.

KOŚCIELNA 13

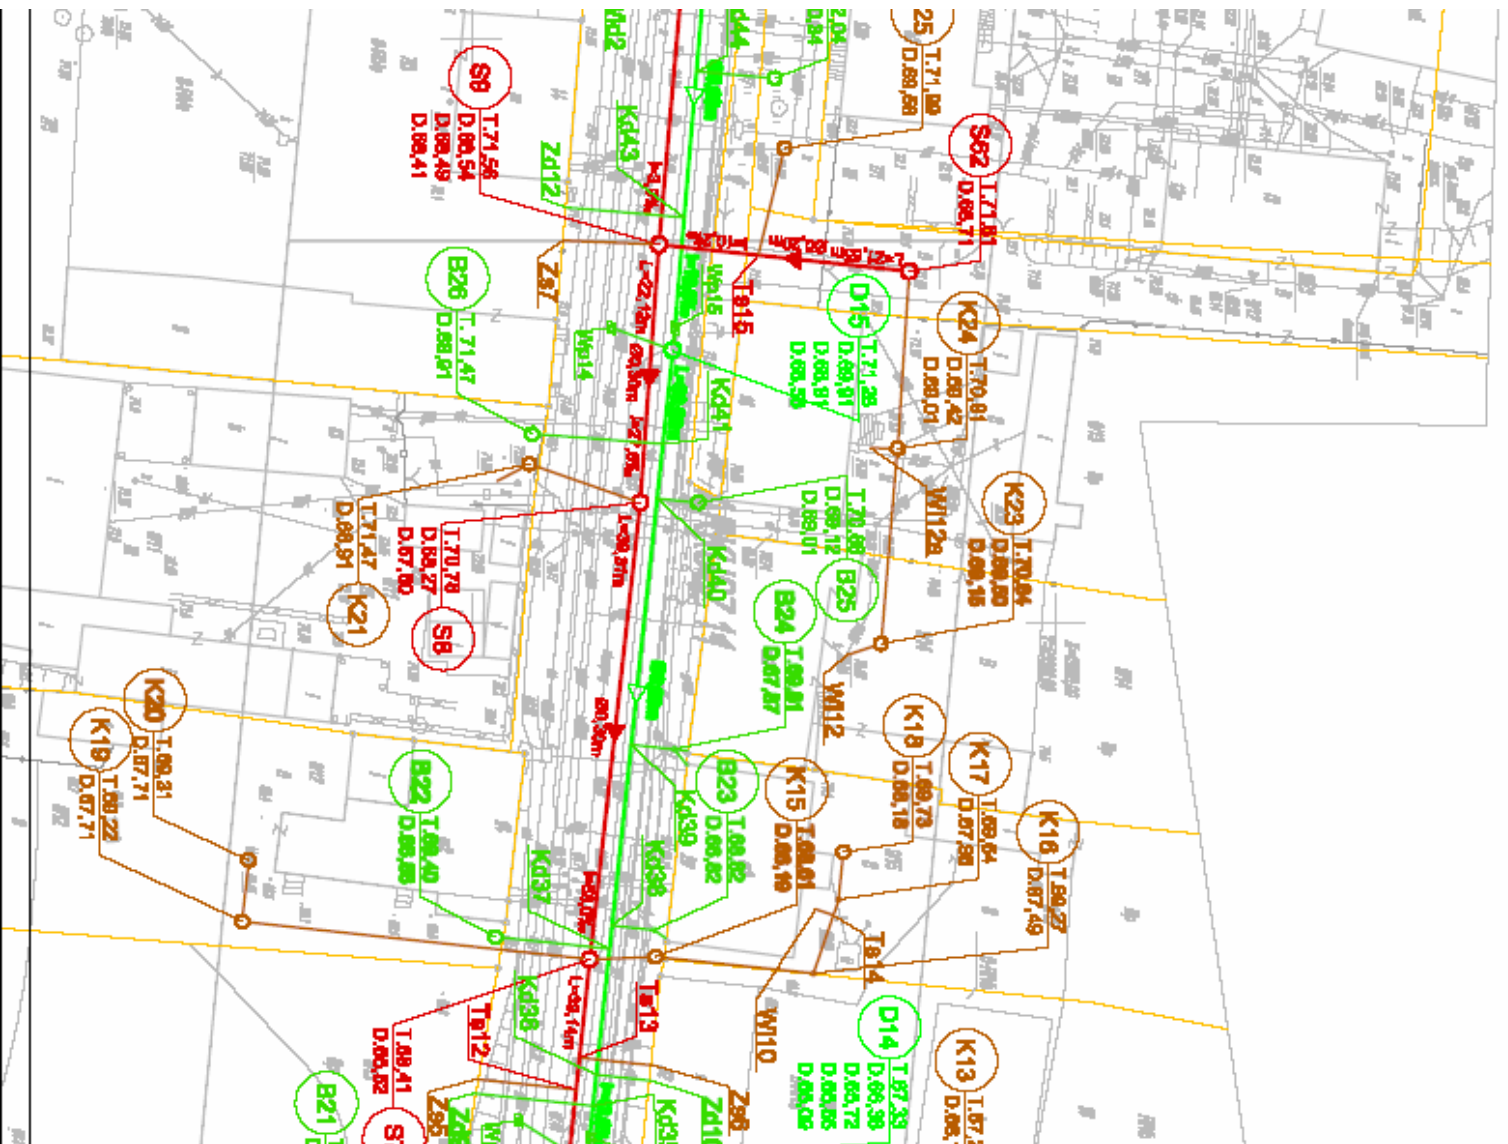

BUDYNEK 13

Budynek wolnostojący - lokal użytkowy, pustostan po zakładzie produkcyjnym.

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA – brak projektu instalacji zewnętrznej

1. Kanalizacja sanitarna – wykonana zgodnie z projektem
 - a) Przyłącze przy granicy posesji studnia K21
2. Kanalizacja deszczowa- wykonanie zgodnie z projektem
 - a) studnia B 26


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. łazienki i WC legalne

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

brak

KOŚCIELNA 15, 18, 20

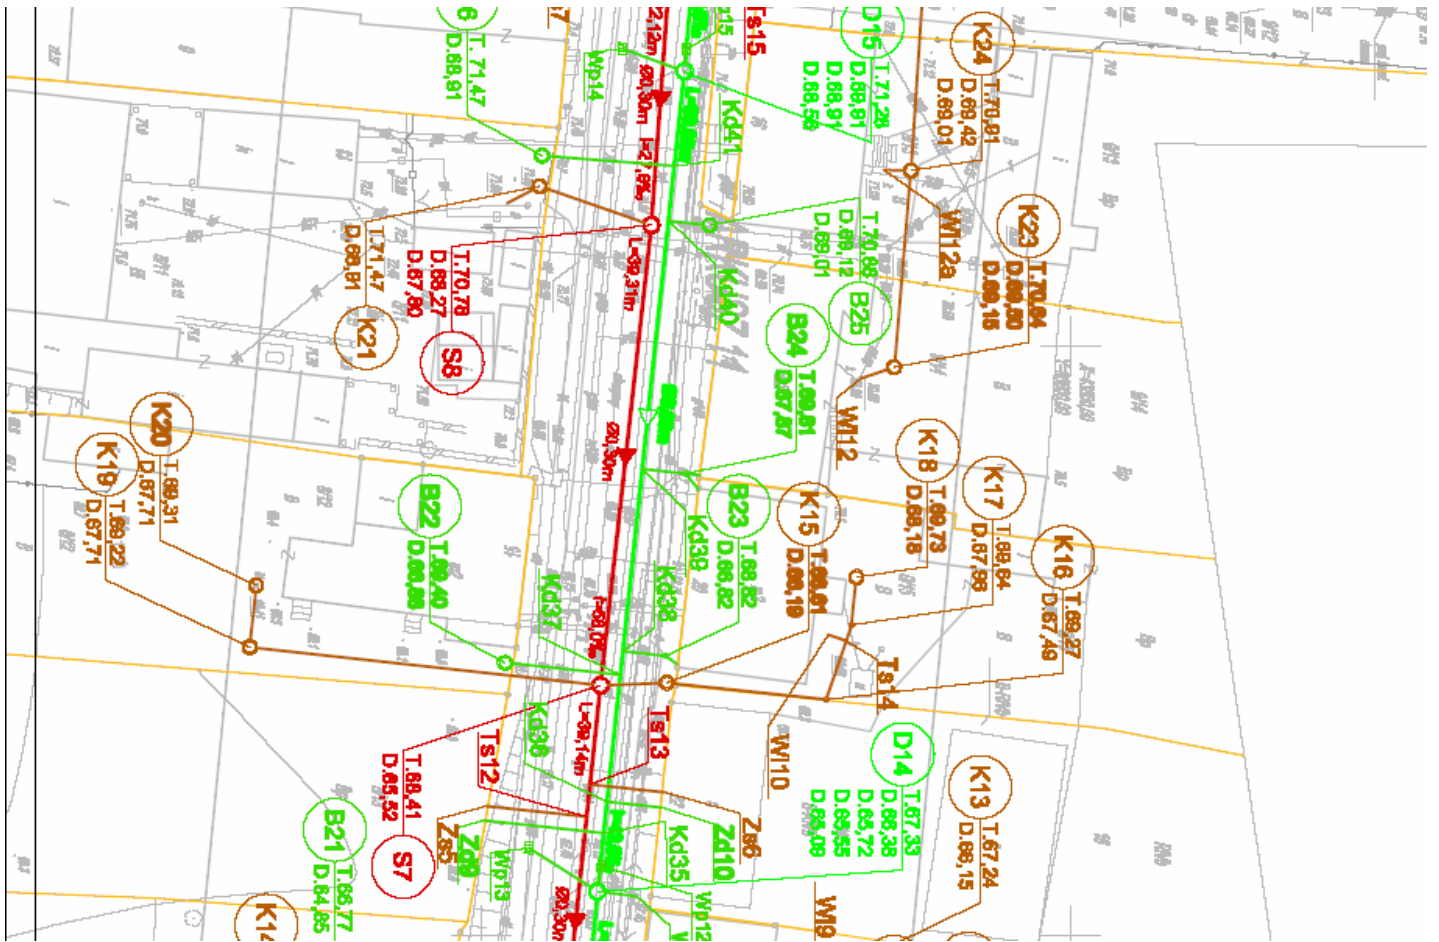

BUDYNEK 15 – Lokal docelowo czynszowy

Umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA – zaprojektować instalację sanitarna i deszczową

1. Kanalizacja sanitarna- brak projektu instalacji zewnętrznej
 - a) studnie K20, 19
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji zewnętrznej i podłączenia do budynku.
 - a) studnia B22

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Lokal Użytkowy nr 1
2. Lokal Użytkowy nr 2
3. M3 – WC w podwórzu – zaprojektować WC
4. M4 – WC w podwórzu – zaprojektować WC

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki lub likwidacji
2. Szambo od toalet do likwidacji

BUDYNEK 18 – EKSPERTYZA DOT. REMONTU KAPITALNEGO UMOWA ZE ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna- wykonany projekt
 - a) Wł 12 do K 23
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu
 - a) studnia B24

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Lokal Użytkowy nr 1,
2. M2 i M3 – posiadają łazienki z WC legalne

III. LIKWIDACJA /ROZBIÓRKA

BRAK

BUDYNEK 20

UMOWA ZE ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – wykonany projekt i podłączenie do budynku
 - a) Wł 10 do Ts 14
 - b) Wł 12 do studni K23
 - c) studnie K 17, K18, K16, K15
2. Kanalizacja deszczowa- nie ma projektu instalacji
 - a) studnia B23

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- WC w kuchni wydzielone- brak legalizacji
2. Pozostałe M korzystają ze wspólnych WC na klatce schodowej

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki


a) studnia B25

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- łazienka zalegalizowana
2. M2 – łazienka w pokoju do zalegalizowania
3. M3- Toaleta z wejściem z pokoju – nie zalegalizowane
4. M4 – łazienka z WC nie zalegalizowana
5. M5 – Kabina i wc w kuchni bez legalizacji
- 6.M6 – łazienka z wejściem z klatki –zalegalizowana

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

- 1.Toalety w podwórzu do rozbiórki
2. Szambo od toalet podwórzowych do likwidacji

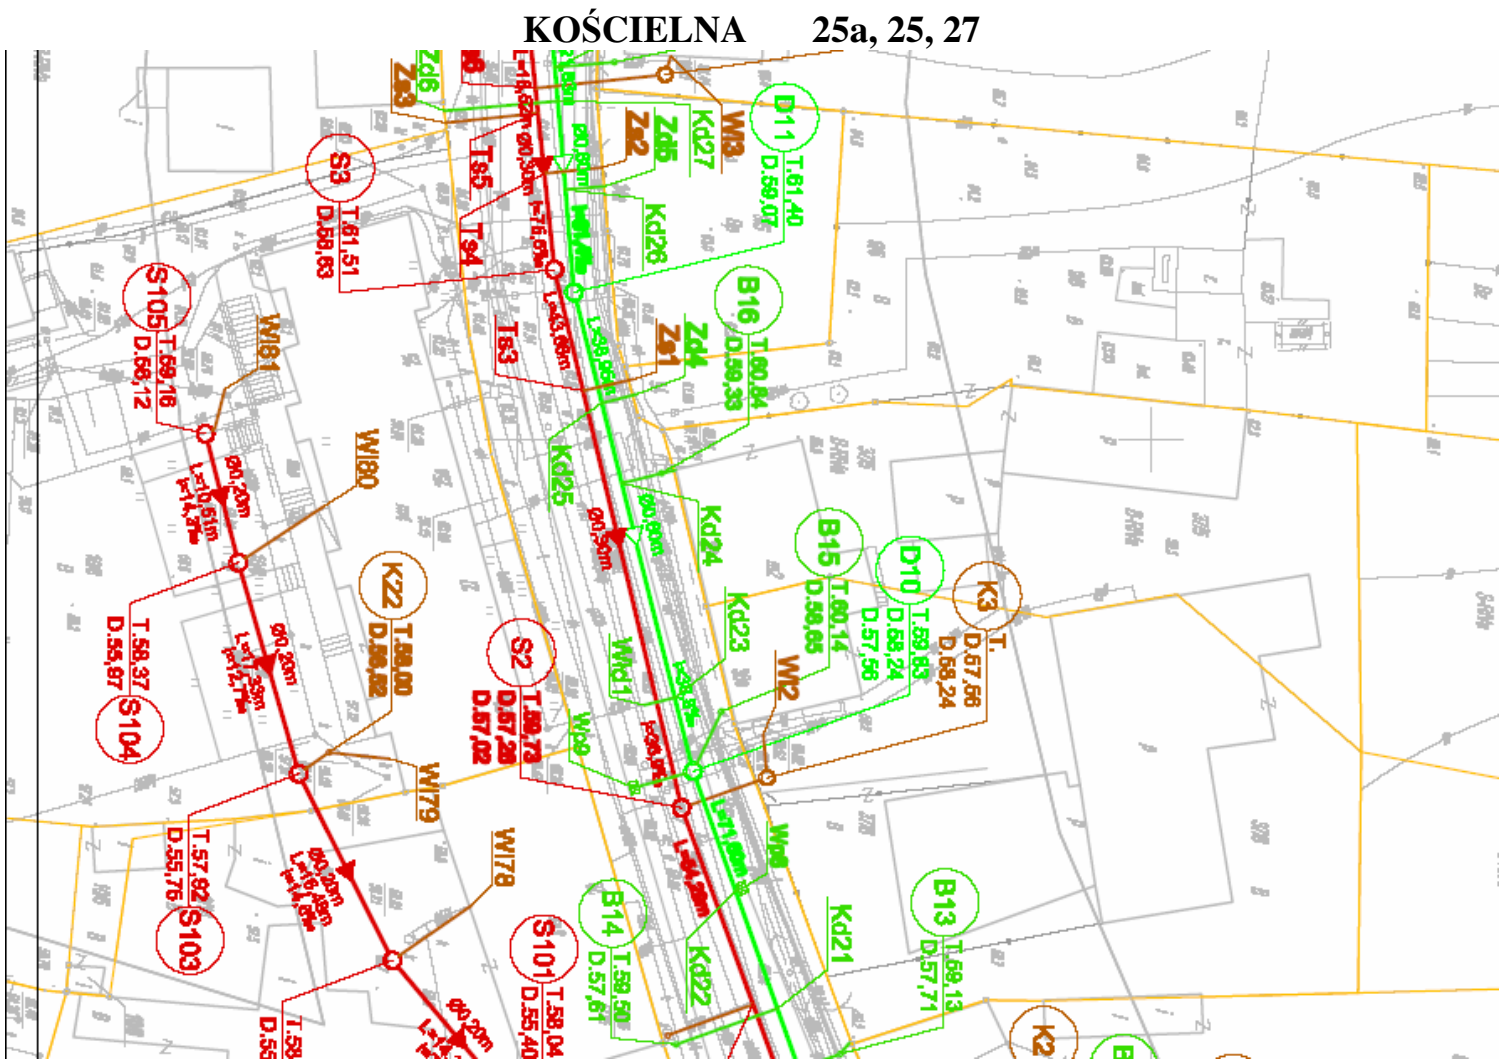

BUDYNEK 25a, 25, 27, 27a – zasób docelowo czynszowy, nowy budynek

Jest umowa ze ZWiK


I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – są projekty i podłączenia do budynków
 - a) Wł 78, 79, 80, 81 do studni S 103, S 104, S 105
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu
 - a) B 14

II. KANALIZACJA WEWNĘTRZNA -wszystkie nowe lokale posiadają łazienki z WC legalne

III. LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

Brak

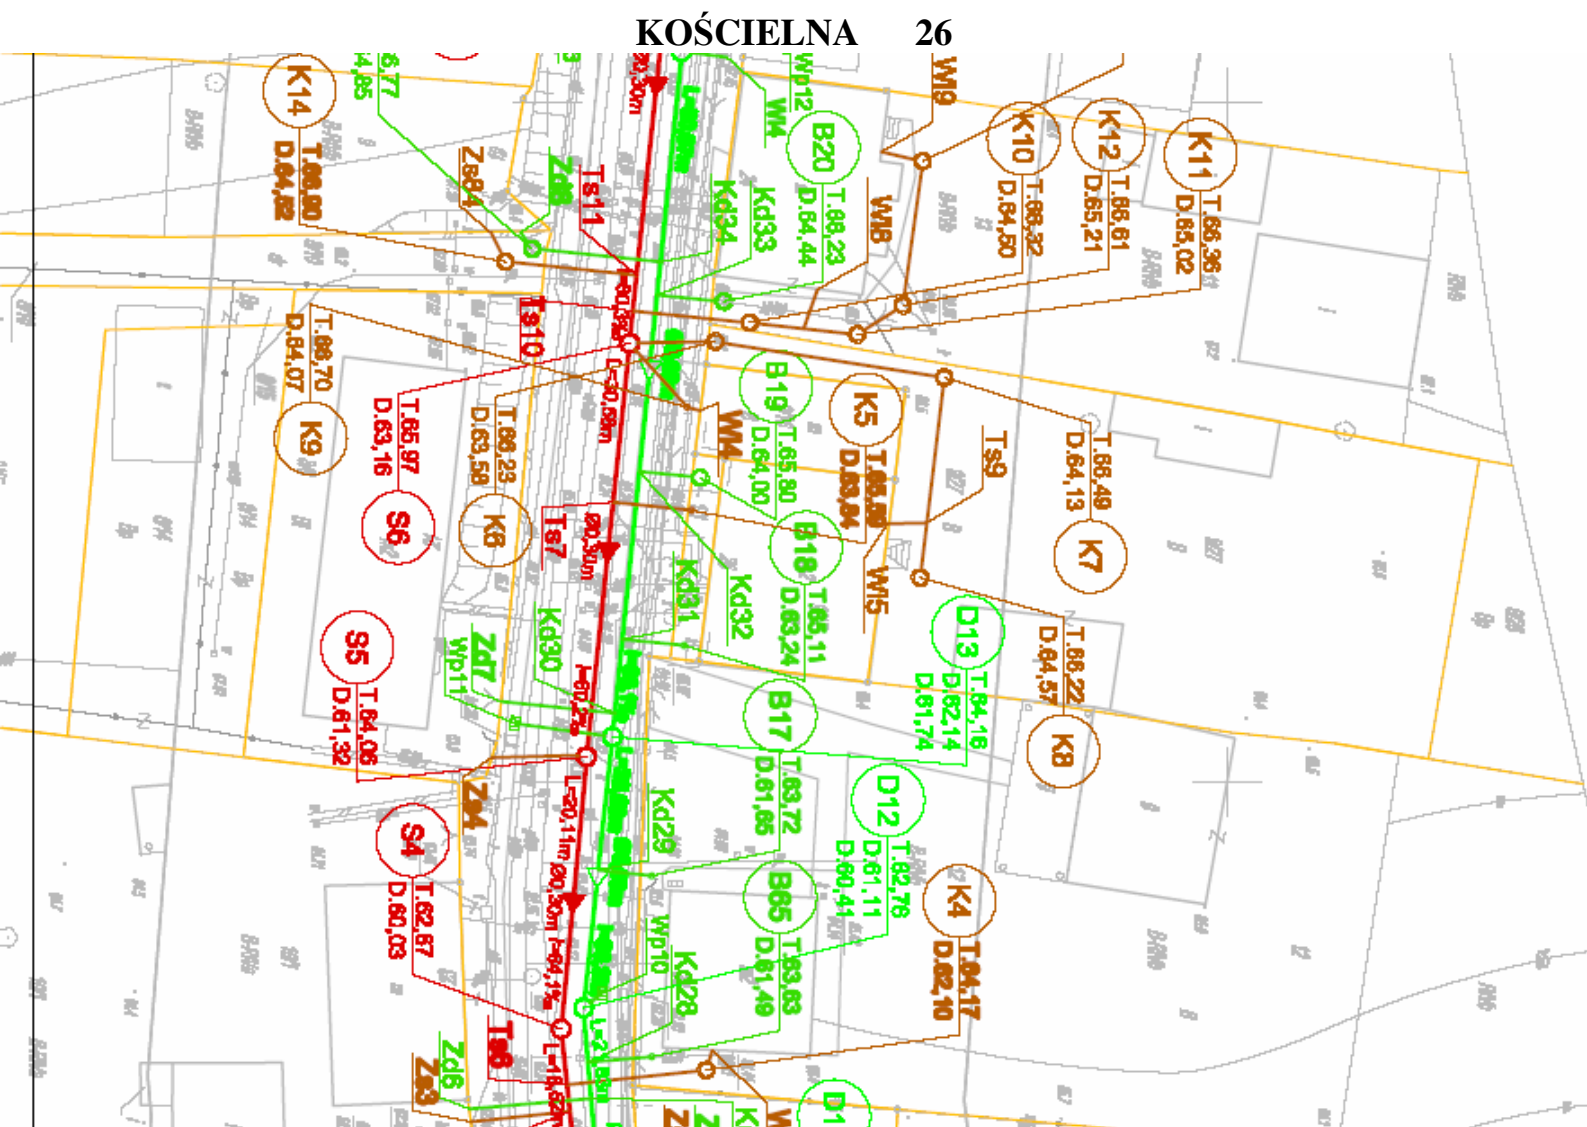

BUDYNEK 26

Jest umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt na 2 włączenia do budynku

- a) Wł4 do studni K 9
- b) studnie K8, K5
- c) Wł 5 do Ts 9

2. Kanalizacja deszczowa – jest projekt na jedno podłączenie

- a) Studnia B19 – nie podłączona do budynku- brak projektu instalacji
- b) studnia B18 podłączona


II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- 1. M1- WC w lokalu- legalna
- 2. M 3, 4 – łazienki w lokalach legalne

III. LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

- 1. Szambo w podwórzu do likwidacji.

KOŚCIELNA 29, 40

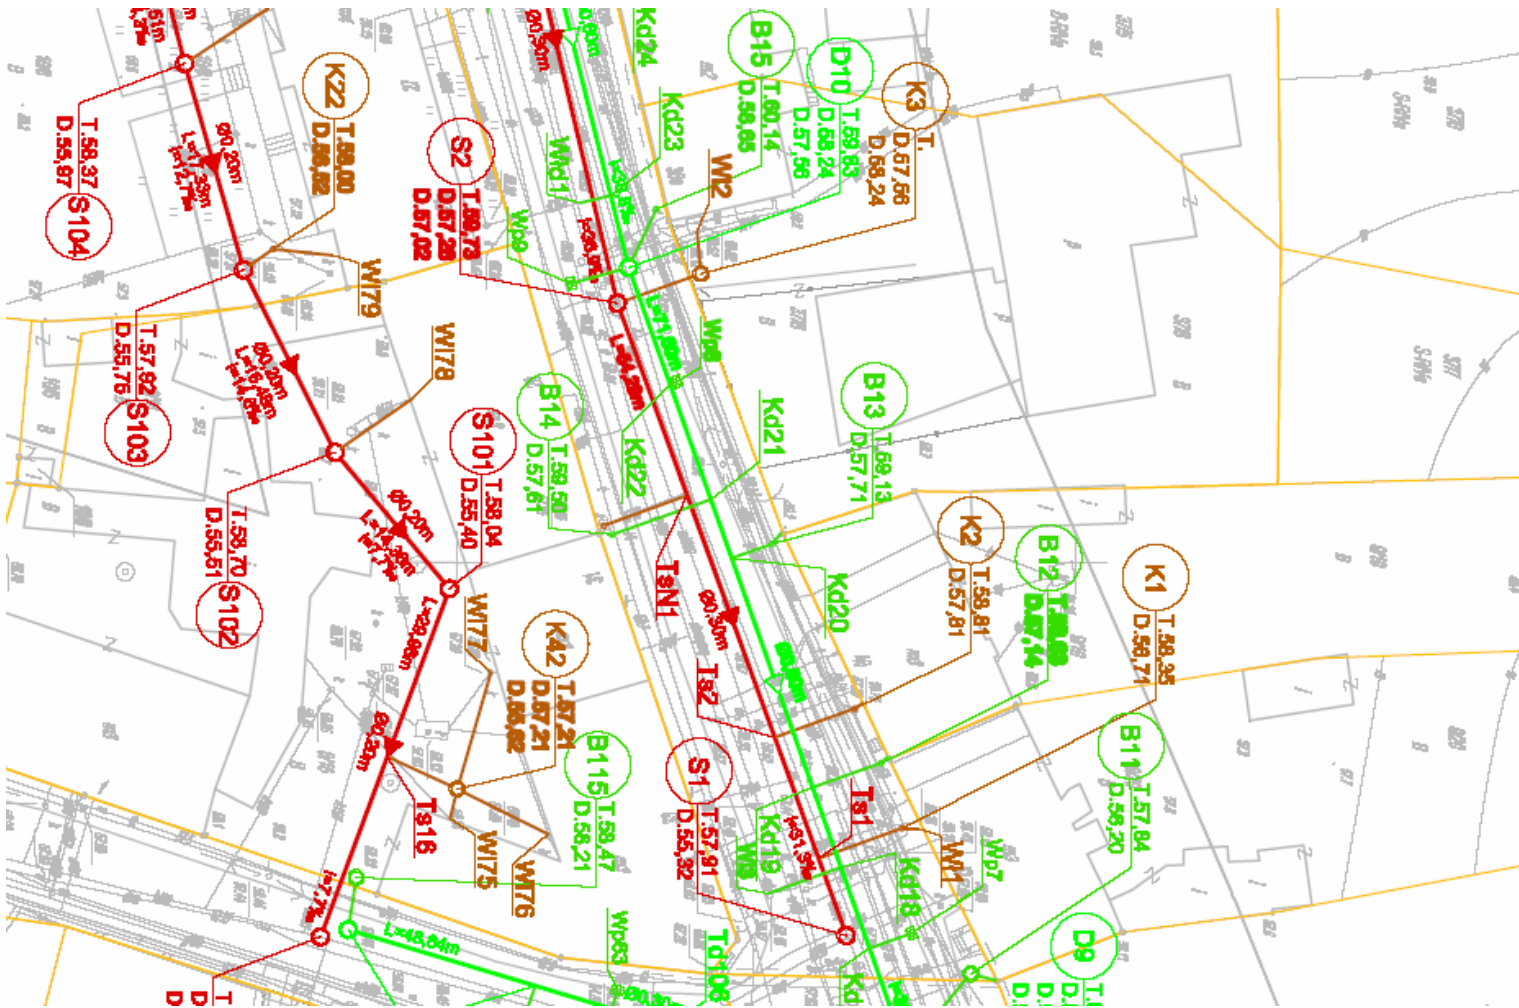

BUDYNEK 29 – przeznaczony do rozbiórki

Umowa ze ZwiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna - jest projekt i przyłączenie do budynku
 - a) W1 78 do studni S 102

2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji
 - a) Studnia B14

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Wszystkie lokale mają łazienki lub WC zalegalizowane

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Szambo w podwórzu do likwidacji po sprawdzeniu, czy nie posłuży jako miejsce przelotu rury przyłączeniowej do budynku.

BUDYNEK 40- przeznaczony do rozbiórki

Umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt i podłączenie do budynku dla W11 do K1. Brak projektu Włączenia do budynku od Studni K2
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji
 - a) studnie B12 z odrzutem do budynku
 - b) studnia B13 z odrzutem do budynku

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Dla lokalu M 6 brak toalety
2. M 7 – łazienka zalegalizowana
3. Pozostałe lokale posiadają WC bez legalizacji

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toaleta 4 szt w podwórzu do rozbiórki
2. Szambo w podwórzu do likwidacji po sprawdzeniu, czy posłuży jako miejsce przelotu rury przyłączeniowej.

BUDYNEK 31, 33 – BUDYNKI DO ROZBIÓRKI wykwaterowane
Umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA


1. Kanalizacja sanitarna- jest projekt i przełączenie
 - a) Wł 75,76,77 do studni K42 i S 101
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu i podłączenia instalacji
 - a) B 115

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Budynki w trakcie wykwaterowywania lokatorów, WC w kuchniach bez legalizacji lub w podwórzach. Nie projektujemy WC , stawiamy toalety przenośne w podwórzach.

III. LIKWIDACJA/ ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do likwidacji
2. Szambo od toalet do likwidacji

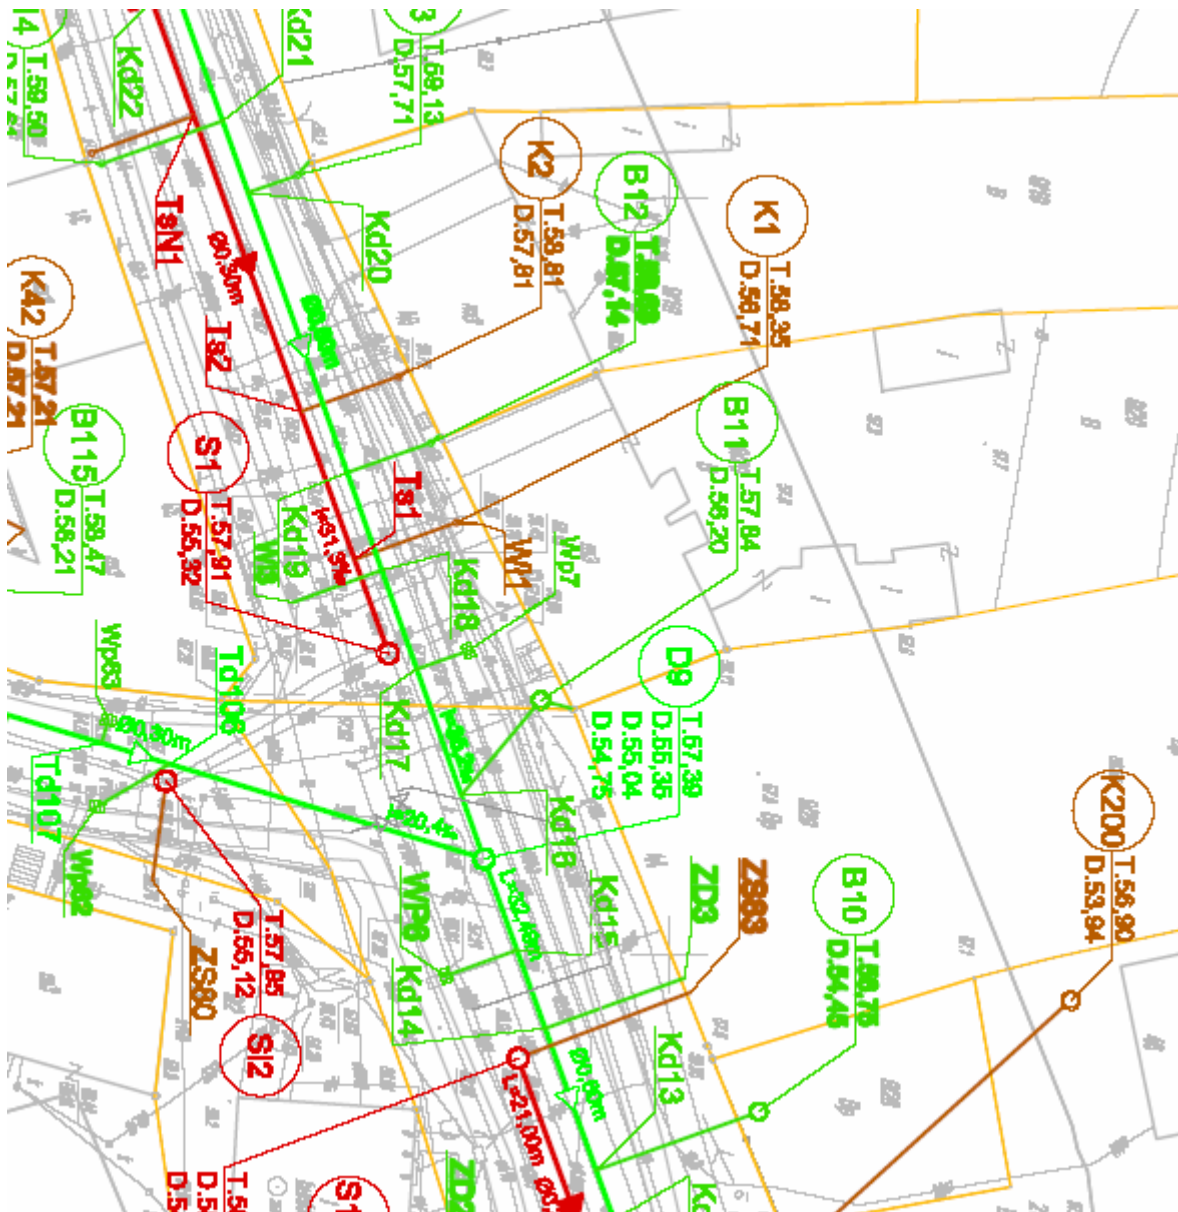

UMOWA ZE ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA


1. Kanalizacja sanitarna – jest projekt i przełączenie
 - a) Wł 1 do studni K1
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu
 - a) studnia B11 z odrzutem do budynku

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. Wszystkie lokale posiadają WC bez legalizacji

III. LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu do rozbiórki
2. szamba od toalet do likwidacji

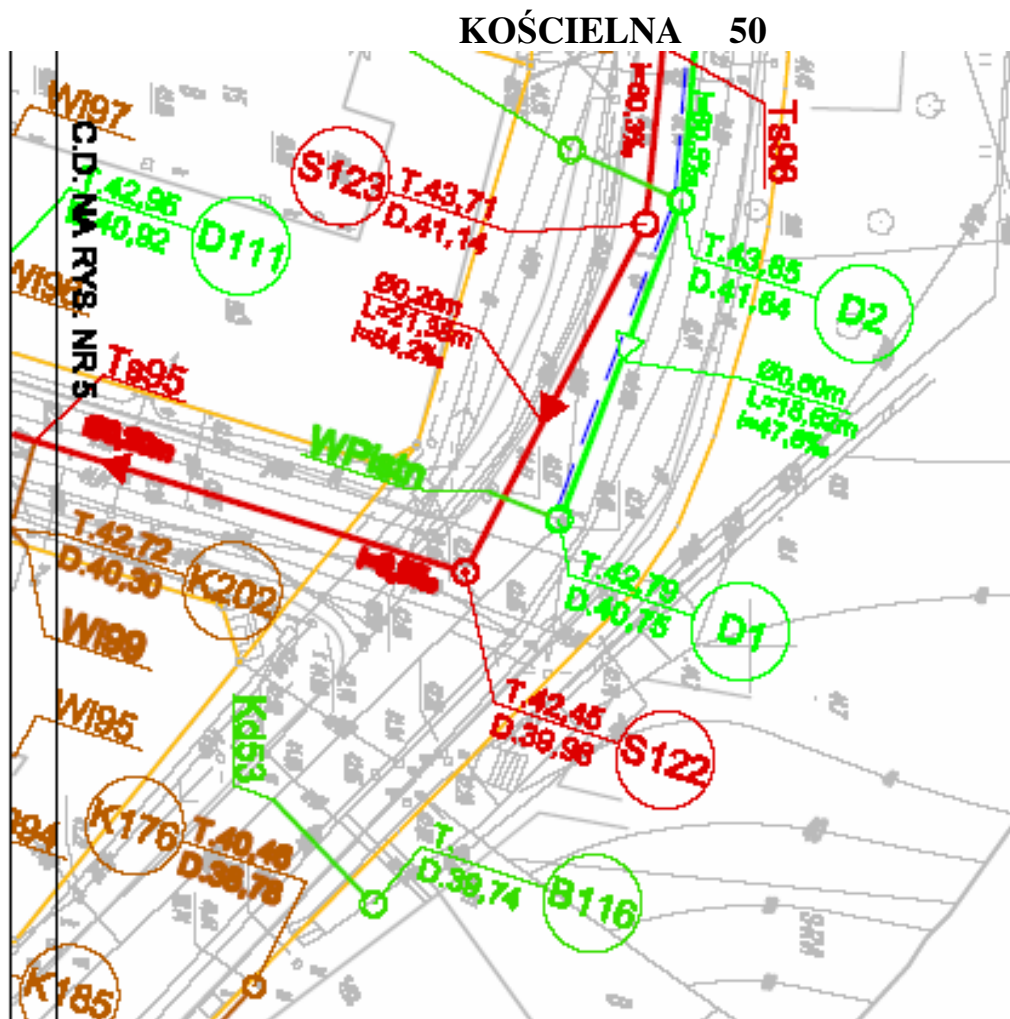

BUDYNEK 50 – przeznaczony do rozbiórki

Jest umowa ze ZWiK

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna- jest projekt i podłączenie do budynku
2. Kanalizacja deszczowa – brak projektu instalacji i podłączenia do nowo wybudowanej sieci
 - a) studnia B116 nie jest podłączona do budynku

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

1. M1- łazienka zalegalizowana
2. M2, M3, M4- WC w budynku

III. LIKWIDACJA / ROZBIÓRKA

Brak

BUDYNEK 9- zasób docelowo czynszowy
Umowa ze ZWiK na odprowadzenie ścieków

I. INSTALACJA ZEWNĘTRZNA

1. Kanalizacja sanitarna – wykonany projekt i podłączenie do budynku
 - a) Wł 13 ,14

2. Kanalizacja deszczowa – wykonany projekt i podłączenie do budynku
 - a) WłdN 16 do studni B 29

II. INSTALACJA WEWNĘTRZNA

- a) M1, M2, M4 – WC i wanna w kuchniach bez wydzielenia – nielegalne
- b) M3, M6, M7, M8, M9, M13, M14 – zapewnić WC
- c) M10, M11- łazienki w kuchniach nielegalne

III. LIKWIDACJA/ROZBIÓRKA

1. Toalety w podwórzu- 4 szt do rozbiórki
2. Szambo do likwidacji
